

Prestação Parcial de Contas

Projeto Escola de Conselhos de Roraima

**Documento de Referência:**

Termo de Execução
Descentralizada (TED)
002/2025

**Janela de Análise:**

Setembro de 2025 a
Junho de 2026

**Entidade Executora:**

Instituto Federal de
Roraima (IFRR)



Execução Acadêmica



Vagas Executadas.
Apenas **35,6%** da
meta mínima inicial
do TED.

Execução Financeira de Pessoal

~**48%** do Orçamento Executado



R\$ 165.240 executados de R\$ 328.620

O projeto atinge 15 municípios com execução orçamentária rigorosamente dentro do cronograma parcial

15

Municípios Atendidos

Distribuídos em 4 polos estratégicos em Roraima.

48%

Execução do Orçamento de Pessoal

R\$ 165 mil executados dos R\$ 328 mil previstos, garantindo fôlego para o encerramento em 2026.

61%

Taxa de Conclusão Efetiva

130 vagas executadas a partir de 213 matrículas institucionais.

Os dados refletem a análise consolidada do sistema institucional (SUAP, SISTEC/AVA) referente ao Edital nº 10/2025 - PROEX/IFRR.

Meta Mínima TED

365

Selecionados
(Edital 10/2025)

229

Restrição de
procura inicial

**Matriculados
no Sistema**

213

Ponto de partida
real = **100%**

Concluintes
(Vagas Executadas)

130

Taxa de Conclusão:
61,03%



Atenção: Perda absoluta de 83 formandos.
A taxa de evasão real durante a execução
do curso fixou-se nos **38,97%**.

Matriz de Diagnóstico por Pólo

Pólo (Municípios)	Inscritos -> Concluintes	Taxa de Eficiência
Bonfim (2 municípios)	20 -> 17	85,00%
Amajari (3 municípios)	32 -> 20	62,50%
Rorainópolis (6 municípios)	28 -> 17	60,71%
Boa Vista (4 municípios)	133 -> 76	57,14%

Apesar de possuir o maior volume de inscritos, Boa Vista perdeu 57 alunos no processo. O maior pólo é responsável pela **maior perda absoluta do projeto.**

Engajamento por Perfil: O Alerta Crítico no CMDCA



Conselheiros Tutelares (CT)



(46 concluídas de 85 previstas). Maior engajamento proporcional.



Sistema de Garantia (SGDCA)



(78 concluídas de 221 previstas). Maior volume absoluto, mas retenção mediana.




Conselhos Municipais (CMDCA)



(Apenas 6 concluídas de 59 previstas). **Desempenho mais crítico do projeto, exigindo revisão imediata da estratégia de mobilização.**

Saúde Financeira: Execução do Orçamento de Pessoal (RH)

48% Executado (Progresso Parcial Saudável até Jun/2026).

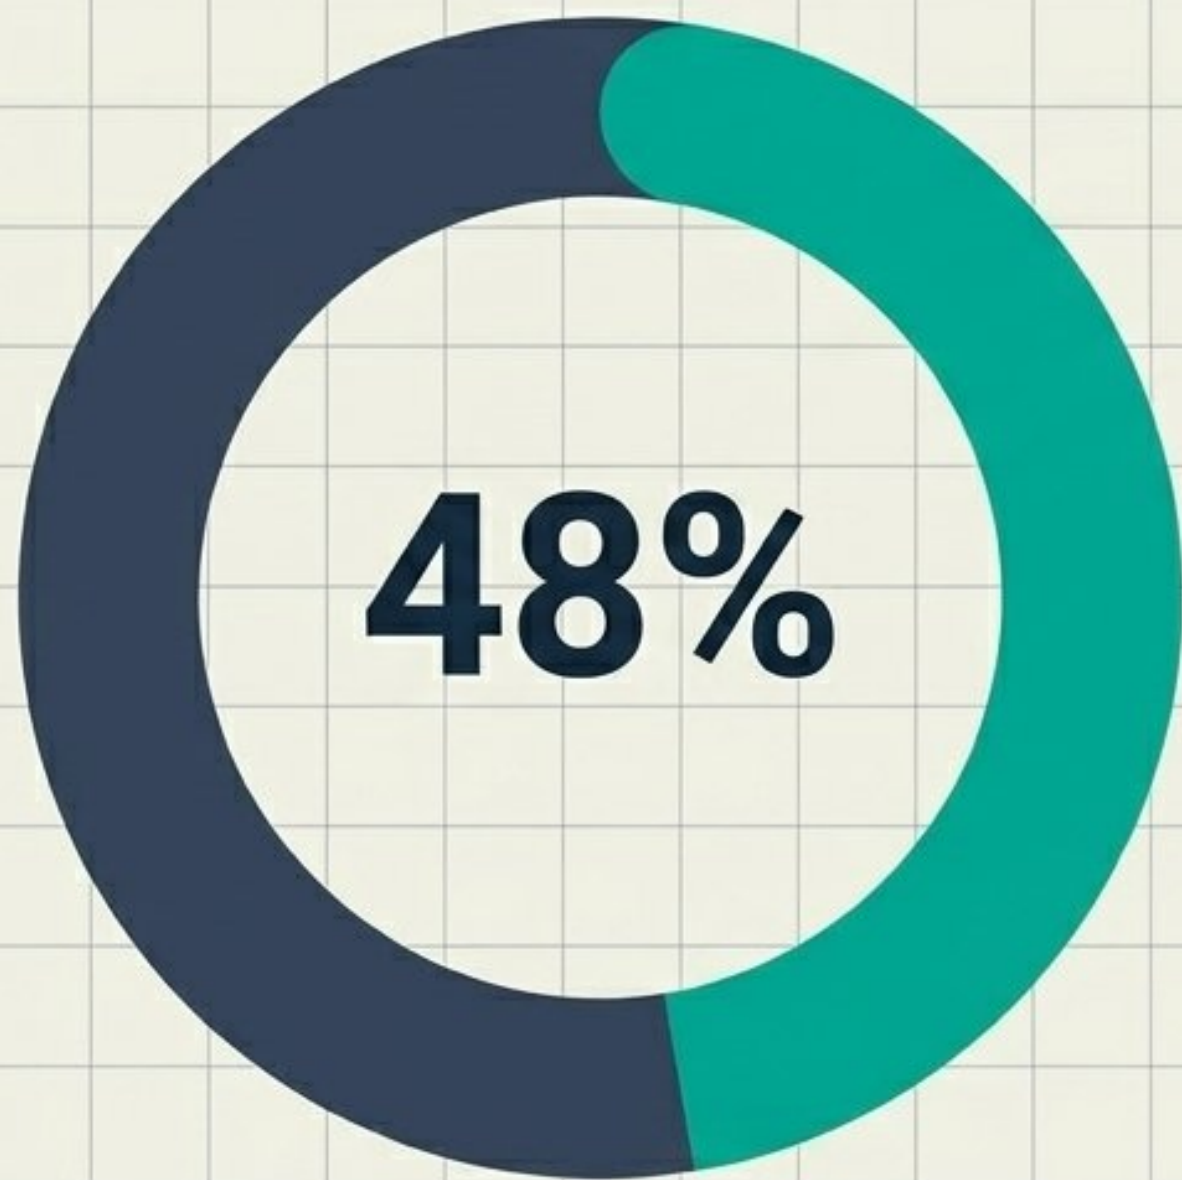

Orçamento Total Previsto:

R\$ 328.620,00

Valor Executado:

R\$ 165.240,00


Saldo Remanescente:

R\$ 163.380,00

O orçamento restante garante a continuidade do projeto. Há parcelas significativas vinculadas a contratações futuras e pagamentos de bolsas já programados para se estenderem até o final de 2026 e início de 2027.

R\$ 149 mil executados em infraestrutura de custeio e materiais institucionais para 520 cursistas

Os Números

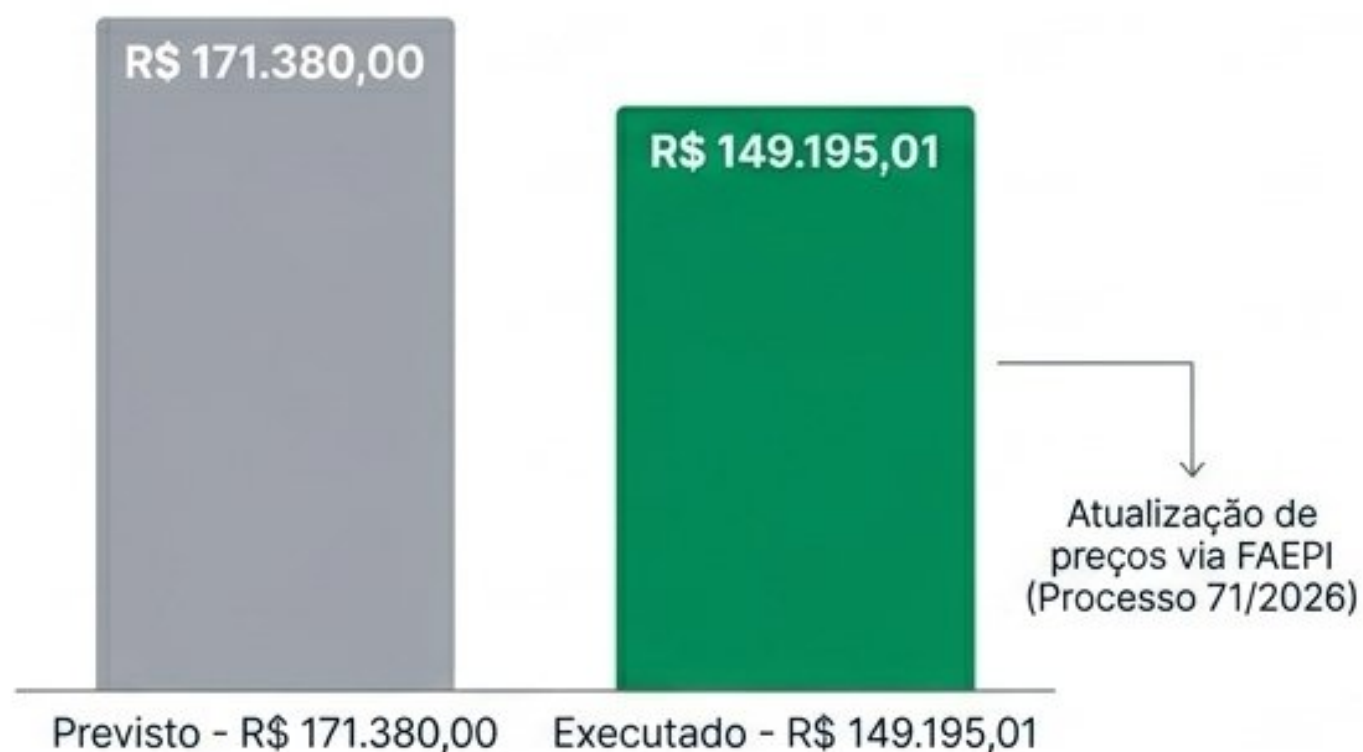

As Entregas



Mochila:
520 unidades
(R\$ 43.680)



Garrafa Térmica:
520 unidades
(R\$ 17.160)




Camiseta:
520 unidades
(R\$ 17.160)



Serviços/FAEPI:
Serviços Técnicos
(R\$ 50.000)

- O valor não utilizado em INSS Patronal (R\$ 14.052) será convertido em suplementação para combustível, apostilas e diárias.


Acompanhamento de Metas Oficiais (1 e 2)

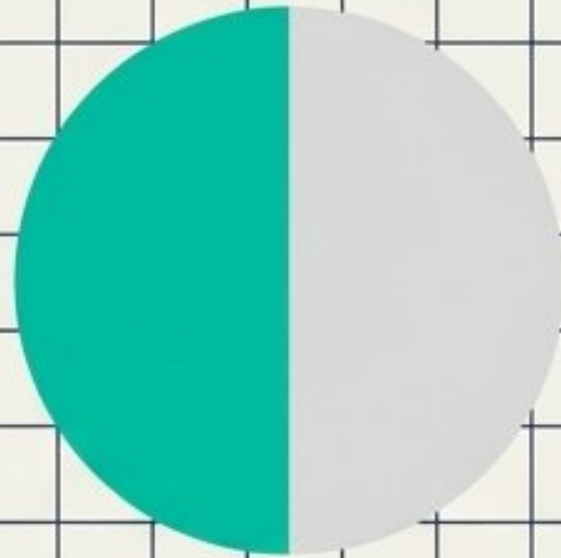

META 1 (Estruturação Organizacional)

Status: Parcialmente Cumprida / Em Andamento.

- Planejamento de ações finalizado. Coordenadores gerais, adjuntos e polos alocados. Pagamento FAEPI (DOA) de R\$ 50.000 concluído. Restam parcelas de bolsas até fechar o TED.

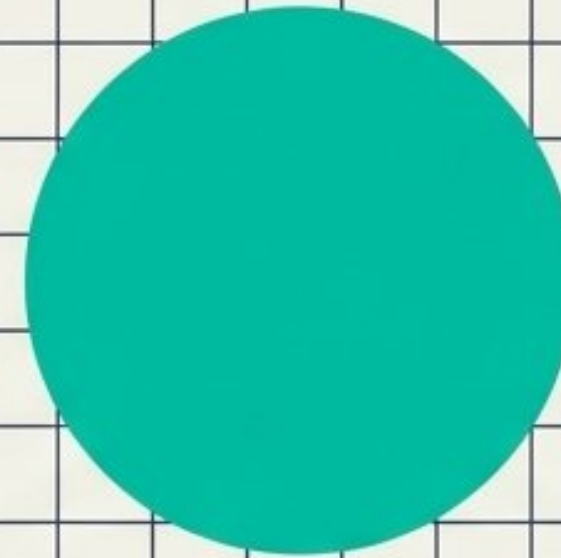

META 2 (Mobilização e Articulação)

Status: Cumprida.

- Edital 10/2025 executado.
- 213 matrículas inseridas no SUAP/SGC/AVA. Ambiente Virtual de Aprendizagem ativo.
- Materiais institucionais comprados e distribuídos aos polos.


Acompanhamento de Metas Oficiais (3 e 4)



META 3 (Formação Continuada)

Status: Em Execução Ativa.

- Oferta simultânea de 15 turmas.
- Atuação de 28 professores presenciais e 14 tutores EAD.
- Diárias de acompanhamento (R\$ 2.010 executados).
- Custeio de combustível operacionalizado.

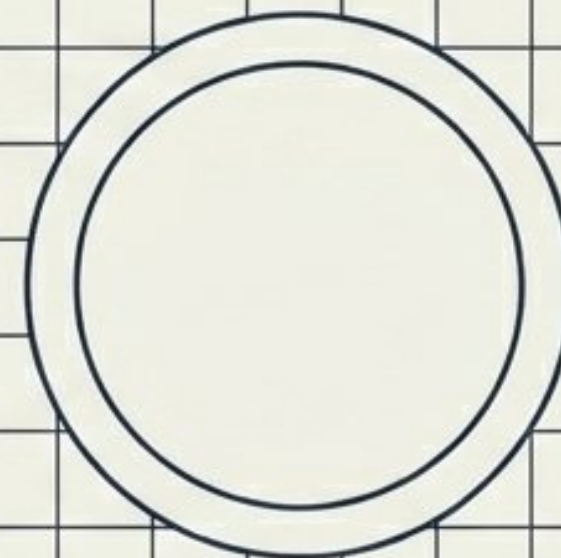

META 4 (Prestação de Contas e Sistematização)

Status: Em Fase de Planejamento (Julho a Dezembro 2026).

- Coordenadores alocados para sistematização de experiências.
- Orçamento de R\$ 10.500 reservado e intacto para editoração gráfica e revisão textual do material metodológico final.

Gargalos Críticos e Pontos de Atenção



O Silêncio Burocrático (MDHC)

Há uma pendência crítica de análise do MDHC sobre a **reestruturação metodológica** do TED nº 002/2025.

Evidência Institucional: Ofícios do IFRR (nº 82/2026, nº 235/2026 e nº 313/2026) enviados entre fevereiro e maio, todos sem resposta até o presente momento.



O Desengajamento Institucional (CEDCAR)

Observa-se ausência de engajamento do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCAR) nas ações de mobilização.

Impacto direto: Esta lacuna é a causa-raiz da baixíssima execução (10,2%) do público-alvo CMDCA.
